


المقاول	وكاله التعمير و المشاريع	الاستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	الاداره العامه للتنفيذ و الاشراف	مكتب رمك للإستشارات الهندسية
تقديم جديد ☒	اداره تنفيذ الطرق	
تقديم اعاده ☐	مشروع تلال الغروب	
	استمارة طلب تسليم رقم	الاعمال المساحيه و الترابيه

اسم الحي: الامير فواز
رقم المخطط: BLOCK11
رقم الشارع: 22.2
من محطة رقم: 12.5+0
إلى محطة رقم: 150+0
استلام الطبقة: BOTTOM SUBGRADE

توقيع مهندس الموقع: 
المساح ☐ المراقب ☐
ملاحظات:

ملاحظات:

نتيجة تدقيق المساحة:

من المحطة: 0+12.5
إلى المحطة: 0+12.5

من المحطة:
إلى المحطة:

مرفقات: ☐ القطاع الطولي ☐ القطاع العرضي ☐ اخري ☐

متطابق ☒
غير متطابق ☐

ملاحظات: التاريخ: / /

من محطة:
إلى محطة:
توقيع المساح: التاريخ: / /

نتيجة تدقيق المواد:

تصنيف المواد: ☐ مرفق ☐ قيمه البركتور: الرطوبه المثلي:
غير مرفق ☐

رقم الاختبار	رقم المحطة		نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات
	من محطة	إلى محطة					

النتيجه: ☐ ناجح ☐ راسب ☐ التوقيع: التاريخ: / /

ملاحظات:

تعليمات المهندس الاستشاري: ☒ موافق ☐ غير موافق

التوقيع: 

تم الاستلام: مندوب المقاول: التاريخ: / /

B.A 52.234

B.S. 1.300

H.T 53.534



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy

تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
Rivadh Roads Contracting Co. Ltd. (1010284000) - 0249724972 - 0249724972



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIVADH ROADS CONTRACTING CO.

الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية				الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق				المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات				
تقرير إستلام طبقة ردم												
ROAD-B11-1		رقم الشارع :-		تأكل القرب				اسم المشروع :-				
214 M		طول الشارع :-		BLOCK11				رقم المخطط :-				
22.2		عرض الشارع :-		BOUOTOM OF SUPGRADE-1				رقم الطبقة :-				
WIDHT-R		11.100		LAYER THICKNESS				0.150				
WIDHT-L		11.100		DEPTH FROM TOP SUB G				0.000				
PVI	Station	Easting	Northing	L		CL		R		CL width from L	CL width from R	
SLOPE				1.15%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	1.15%		
				2.650	5.500	3.000	0.000	3.000	5.500	2.600		
1	0	528760.253	2370342.686	52.510	52.480	52.430	52.430	52.430	52.480	52.510	11.100	11.100
2	12.5	528771.791	2370337.88	52.466	52.436	52.386	52.386	52.386	52.436	52.466	11.100	11.100
3	25	528783.33	2370333.073	52.334	52.304	52.254	52.254	52.254	52.304	52.334	11.100	11.100
4	37.5	528794.869	2370328.266	52.080	52.050	52.000	52.000	52.000	52.050	52.080	11.100	11.100
5	50	528806.408	2370323.459	51.826	51.796	51.746	51.746	51.746	51.796	51.826	11.100	11.100
6	62.5	528817.947	2370318.652	51.679	51.649	51.599	51.599	51.599	51.649	51.679	11.100	11.100
7	75	528829.486	2370313.845	51.582	51.552	51.502	51.502	51.502	51.552	51.582	11.100	11.100
8	87.5	528841.024	2370309.039	51.354	51.324	51.274	51.274	51.274	51.324	51.354	11.100	11.100
9	100	528852.563	2370304.232	51.098	51.068	51.018	51.018	51.018	51.068	51.098	11.100	11.100
10	112.5	528864.102	2370299.425	50.853	50.823	50.773	50.773	50.773	50.823	50.853	11.100	11.100
11	125	528875.641	2370294.618	50.725	50.695	50.645	50.645	50.645	50.695	50.725	11.100	11.100
12	137.5	528887.18	2370289.811	50.596	50.566	50.516	50.516	50.516	50.566	50.596	11.100	11.100
13	150	528898.718	2370285.004	50.347	50.317	50.267	50.267	50.267	50.317	50.347	11.100	11.100
الإستشاري												
مكتب رمك للإستشارات الهندسية												
الإسم :- م حسين حسين عبده												
التوقيع :-												
التاريخ :-												



In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-240463.11
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Report Date	18/04/2024
Location	جدة - حي الامير فواز - مخطط تلال الغروب	E.Conditions	-
Test Apparatus	NL scientific	Ref.	ASTM D 7698

Layer	Bottom Sub Grade
Location	Block 11 STA. 0+12.5 to STA. 0+150

FIELD TEST RESULTS						
TEST NO.	LOCATION	wet denisty	dry denisty	water content	compaction	percent req.
		kg/m3	kg/m3	%	%	%
1	0+50	2.247	2.089	7.6	96.5	95
2	0+70	2.198	2.061	6.6	95.2	95
3	0+120	2.191	2.067	5.98	95.5	95
4	0+140	2.266	2.116	7.11	97.8	95

M.D.D = 2.164 kg/m3
O.M.C = 7.48 %

The lab is responsible of all information provided in this report, unless this information is given by the client.

*These results are for the tested materials and tested locations only.

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.

The report will not be re issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test reoport date.

Checked by


[Signature]



Approved by

[Signature]



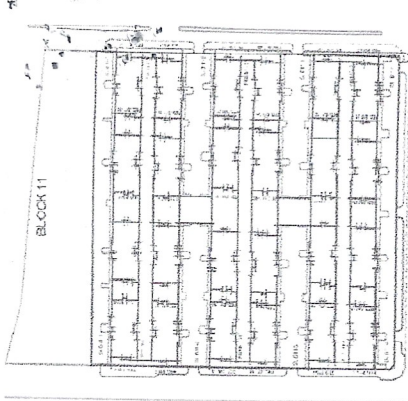

اتجاه صرف المياه
الارض الطبيعية
الخط التصميمي
الحدائق

المساحة المصنفة المصنفة
المنطقة المصنفة
المنطقة المصنفة

المالك / وزارة الإسكان

المطور / شركة سافي الصامرية

المستشار العام / اللجنة للاستشارات الهندسية

المستشار / مكتب ريك الاستشارات الهندسية

تصميم الطرق لمشروع تلال الغروب
بحي الامير فواز شمال - مدينة جدة

معلومات الرسم: 1:500
معلومات الرسم: 1:500

معلومات الرسم: 1:500
معلومات الرسم: 1:500

معلومات الرسم: 1:500
معلومات الرسم: 1:500

معلومات الرسم: 1:500
معلومات الرسم: 1:500

معلومات الرسم: 1:500
معلومات الرسم: 1:500

معلومات الرسم: 1:500
معلومات الرسم: 1:500

معلومات الرسم: 1:500
معلومات الرسم: 1:500

معلومات الرسم: 1:500
معلومات الرسم: 1:500

معلومات الرسم: 1:500
معلومات الرسم: 1:500

معلومات الرسم: 1:500
معلومات الرسم: 1:500

معلومات الرسم: 1:500
معلومات الرسم: 1:500

معلومات الرسم: 1:500
معلومات الرسم: 1:500

معلومات الرسم: 1:500
معلومات الرسم: 1:500

معلومات الرسم: 1:500
معلومات الرسم: 1:500



شارع عرض ٢٧,٠٠ متر
